


6.0 SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

VALUTA IL TIPO DI COPERTURA SULLA QUALE DEVONO ESSERE SVOLTI I LAVORI

(VEDI TABELLA A QUADRO CONOSCITIVO)

RISCHIO DI CADUTA PER SFONDAMENTO DELLA COPERTURA NON PORTANTE

RISCHIO DI CADUTA PER PRESENZA DI APERTURA SULLA COPERTURA

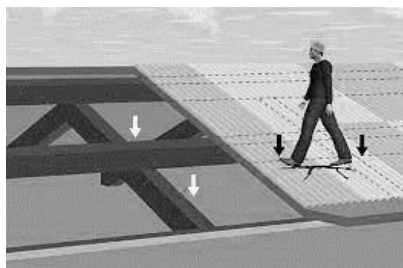

SCHEDE DI RIFERIMENTO

Ponteggio: TABELLA B e C


Reti anticaduta: TABELLA I

Piattaforma di lavoro elevabile: TABELLA G

Trabattello: TABELLA E

Dispositivi di protezione individuale: TABELLA F

RISCHIO DI CADUTA DAI BORDI DELLA COPERTURA



SCHEDE DI RIFERIMENTO

Ponteggio: TABELLA B e C

Parapetto di sommità o guardiacorpo: TABELLA D

Dispositivi di protezione individuale: TABELLA F

RISCHIO DI CADUTA NELLE FASI DI ACCESSO ALLA COPERTURA



SCHEDE DI RIFERIMENTO

Trabattello: TABELLA E

Piattaforma di lavoro elevabile: TABELLA G

Scala a mano portatile: TABELLA H

Nei lavori in quota oltre i 2 m devono essere adottate adeguate impalcature, ponteggi o idonee opere provvisorie o precauzioni atte a diminuire il rischio caduta dall'alto di persone o cose.

A	Quadro conoscitivo	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
A1	E' stato valutato il rischio di caduta dall'alto nei lavori da svolgere?	☐ SI / ☐ NO
A2	In relazione alla tipologia di lavoro e alle caratteristiche della copertura sono stati individuati dispositivi di protezione collettiva /individuale contro le cadute dall'alto?	☐ SI / ☐ NO
A3	E' stata verificata preventivamente la pedonabilità e lo stato di conservazione delle coperture su cui si deve intervenire per sostenere i lavoratori e i materiali d'impiego?	☐ SI / ☐ NO
A4	Le aperture nei solai o nelle coperture sono state preventivamente individuate e protette?	☐ SI / ☐ NO
A5	I lavoratori hanno frequentato corsi di formazione generale e specifica di cui all'Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 con specifico riferimento al rischio di caduta dall'alto?	☐ SI / ☐ NO
A6	I lavoratori sono stati informati in merito alle procedure di lavoro contenute nel Piano Operativo di Sicurezza e/o Piano di Lavoro relativamente alle procedure operative per i lavori svolti in quota/sulle coperture?	☐ SI / ☐ NO

B	Montaggio e smontaggio ponteggi	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
B1	E' stato verificato, preliminarmente al montaggio del ponteggio, che gli elementi da utilizzarsi facciano capo alla medesima autorizzazione ministeriale o in caso di utilizzo misto (marche diverse), che ciò sia previsto dall'autorizzazione ministeriale?	☐ SI / ☐ NO
B2	E' stata effettuata la revisione degli elementi del ponteggio?	☐ SI / ☐ NO
B3	E' stata eseguita la verifica preventiva del piano di appoggio del ponteggio?	☐ SI / ☐ NO
B4	E' stato redatto il Piano di Montaggio Uso Smontaggio del ponteggio?	☐ SI / ☐ NO
B5	Per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri, e per quelli configurati diversamente dalle previsioni riportate sull'autorizzazione ministeriale, è stato redatto uno specifico progetto (calcolo di resistenza e stabilità e disegno esecutivo.) firmato da un ingegnere o architetto abilitato?	☐ SI / ☐ NO
B6	Prima di predisporre il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio e/o di far redigere il progetto da un ingegnere o architetto abilitato, è stato effettuato un sopralluogo ed un rilievo dello stato dei luoghi, esaminando preventivamente gli elementi utili all'installazione del ponteggio (caratteristiche piano posa, tipologia di ancoraggi utilizzabili, necessità di configurazioni fuori-schema o particolari, funzione dell'ultimo impalcato come parapetto per i lavori svolti in copertura, ecc.)?	☐ SI / ☐ NO
B7	E' stata prevista ed individuata la figura di preposto per il montaggio del ponteggio?	☐ SI / ☐ NO

B8	Il personale individuato come preposto e come addetto al montaggio del ponteggio ha ricevuto la formazione prevista dall'art. 136 co.7) del D. lgs.81/08 per svolgere tale attività?	☐ SI / ☐ NO
B9	E' stata eseguita la verifica in cantiere della congruenza del ponteggio installato con il disegno esecutivo e l'eventuale progetto?	☐ SI / ☐ NO

C	Utilizzo di un ponteggio	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
C1	E' stata verificata preventivamente la correttezza e completezza della documentazione di corredo del ponteggio (P.I.M.U.S., progetto, disegno esecutivo, ecc...)?	☐ SI / ☐ NO
C2	E' stata verificata la corretta installazione del ponteggio da utilizzare in cantiere e la corrispondenza con la documentazione a corredo?	☐ SI / ☐ NO
C3	E' stato verificato preventivamente il piano di appoggio del ponteggio?	☐ SI / ☐ NO
C4	E' stato verificato lo stato di conformità rispetto al progetto del ponteggio durante l'evolversi dei lavori?	☐ SI / ☐ NO
C5	E' stata verificata la presenza del progetto e il conseguente adeguamento degli elementi di sommità qualora il ponteggio sia utilizzato come sistema di protezione contro la caduta lungo il perimetro della copertura?	☐ SI / ☐ NO
C6	Qualora il ponteggio sia utilizzato come sistema di protezione contro le cadute dai bordi della copertura, è stato verificato che la distanza dell'ultimo impalcato rispetto al filo superiore della copertura sia minore o uguale a 50 cm?	☐ SI / ☐ NO
C7	Qualora la distanza tra le tavole del piano di calpestio e la muratura sia superiore a 20 centimetri sul ponteggio è stata verificata l'installazione di un regolare parapetto interno ?	☐ SI / ☐ NO
C8	Qualora sia predisposto un piano di calpestio/intavolato al disotto della copertura, contro il rischio di sfondamento della stessa: • l'altezza di caduta è ridotta al minimo • sono stati eliminati i rischi da elementi sporgenti pericolosi • la sua conformazione/utilizzo è prevista nell'autorizzazione ministeriale o vi è la necessità di specifico progetto e calcolo	☐ SI / ☐ NO

D	Utilizzo di parapetti di sommità o guardiacorpo	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
D1	La scelta dei parapetti è stata fatta prendendo in considerazione la pendenza della copertura e l'altezza di caduta secondo la norma UNI EN 13374:2013?	☐ SI / ☐ NO
D2	E' stata controllata la resistenza del punto di ancoraggio dei parapetti prima dell'istallazione?	☐ SI / ☐ NO
D3	E' stato valutato il rischio di caduta dall'alto nelle fasi di montaggio e di smontaggio dei parapetti?	☐ SI / ☐ NO
D4	E' stata controllata la corretta installazione dei parapetti secondo le indicazioni del costruttore?	☐ SI / ☐ NO

E	Utilizzo ponte su ruote a torre - trabattello	
E1	Prima dell'utilizzo del trabattello è stato verificato il corretto montaggio del trabattello così come previsto dal libretto del costruttore?	☐ SI / ☐ NO
E2	La documentazione di corredo dei trabattelli è conservata in cantiere?	☐ SI / ☐ NO
E3	Viene eseguita la revisione degli elementi del trabattello prima del loro reimpiego?	☐ SI / ☐ NO
E4	Il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote è riservato a lavoratori in possesso delle necessarie competenze e conoscenze, acquisite mediante informazione, formazione e addestramento (prova pratica ed esercitazione applicata)?	☐ SI / ☐ NO
E5	Il preposto verifica il corretto utilizzo del trabattello secondo le indicazioni fornite dal costruttore?	☐ SI / ☐ NO
E6	Per i trabattelli conformi alla norma UNI EN 1004:1 2021 è stato verificato che l'altezza (riferita alla quota dell'ultimo impalcato da terra), non superi i 12 m, se utilizzato all'interno in assenza di vento, o gli 8 m se utilizzato all'esterno?	☐ SI / ☐ NO
E7	Quando viene utilizzato il trabattello per lo sbarco in copertura, viene controllata la presenza dei pezzi speciali e la relativa documentazione di corredo?	☐ SI / ☐ NO

F	Utilizzo dispositivi di protezione individuale	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
F1	E' stata eseguita la verifica dell'idoneità delle strutture alle quali il sistema di ancoraggio provvisorio sarà vincolato/fissato?	☐ SI / ☐ NO
F2	Prima di ogni utilizzo, il sistema di ancoraggio è stato verificato dall'utilizzatore?	☐ SI / ☐ NO
F3	Si è verificato che il sistema di ancoraggio sia stato sottoposto a manutenzione periodica (da installatore intermedio).	☐ SI / ☐ NO
F4	L'utilizzo dei DPI è riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto istruzione ed addestramento specifici (comprensivi di prove pratiche ed esercitazioni)?	☐ SI / ☐ NO
F5	Quando vengono utilizzati DPI anticaduta, è stata valutata la modalità di recupero dei lavoratori in caso di emergenza o soccorso?	☐ SI / ☐ NO
F6	E' stata eseguita la verifica dell'integrità e la manutenzione dei vari elementi del sistema di trattenuta o arresto-caduta?	☐ SI / ☐ NO
F7	E' stata eseguita la verifica del tirante d'aria e la presenza di eventuali ostacoli in caso di caduta del lavoratore (aggetti, recinzioni, macchinari ostacoli)?	☐ SI / ☐ NO

G	Utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile (PLE)	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
G1	Viene verificata la corretta formazione degli utilizzatori della PLE?	☐ SI / ☐ NO
G2	Viene eseguita preventivamente la verifica della correttezza e completezza della documentazione di corredo della PLE (libretto, verifica periodica, ecc...)?	☐ SI / ☐ NO
G3	Viene verificata la corretta manutenzione della PLE?	☐ SI / ☐ NO
G4	Viene verificato il corretto posizionamento della PLE in cantiere (pendenza della strada, resistenza del piano di appoggio, presenza di ostacoli, ecc...)?	☐ SI / ☐ NO
G5	Quando viene utilizzata la PLE per lo sbarco in copertura viene controllato preventivamente che ciò sia previsto nelle istruzioni e riportato nella certificazione di conformità?	☐ SI / ☐ NO

H	Utilizzo di scale a mano portatili	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
H1	Viene verificato l'integrità e la corretta manutenzione delle scale come previsto dal fabbricante?	☐ SI / ☐ NO
H2	Viene verificato che il datore di lavoro metta a disposizione la tipologia di scala corretta, in funzione ai lavori da svolgere?	☐ SI / ☐ NO
H3	Le scale a pioli vengono utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri? In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.	☐ SI / ☐ NO

I	Utilizzo di reti di sicurezza per il rischio sfondamento	<i>Spazio da compilare dal Datore di lavoro</i>
I1	E' stato verificato preventivamente che la rete di sicurezza che si intende installare sia di tipo S e abbia un lato corto minimo di 5 m e una superficie minima di 35 mq e rispetti la norma UNI EN 1263?	☐ SI / ☐ NO
I2	Se si installa un rete di tipo XS con lato corto compreso tra 3 e 5 m si è verificato preventivamente che rispetti la norma UNI EN 11808-1 ?	☐ SI / ☐ NO
I3	Se si installa un rete di tipo YS con lato corto compreso tra 2 e 3 m e lato lungo non minore di 4 m si è verificato preventivamente che rispetti la norma UNI EN 11808-2 ?	☐ SI / ☐ NO
I4	Nel caso di installazione delle reti XS (lato corto da 3-5 m) si è verificato che la distanza verticale dal livello di lavoro e il punto di fissaggio della rete sia minore a 2 m ?	☐ SI / ☐ NO
I5	Nel caso di installazione delle reti rettangolari YS (lato corto da 2-4 m) si è verificato che la distanza verticale dal livello di lavoro e il punto di fissaggio della rete sia minore a 50 cm ?	☐ SI / ☐ NO
I6	Per le reti di sicurezza è stata acquisita o calcolata la massima deformazione della rete secondo il manuale d'uso e manutenzione	☐ SI / ☐ NO
I7	Prima dell'inizio dei lavori con utilizzo di reti di sicurezza è stata eseguita la verifica dell'assenza di eventuali ostacoli, in caso di caduta del lavoratore (macchinari, solai, ecc.) tenuto conto della deformazione della rete	☐ SI / ☐ NO
I8	Le reti di sicurezza sono state installate secondo quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione (verifica fissaggi, distanza dei fissaggi, tipo di funi tiranti, funi di accoppiamento, distanze dal bordo)	☐ SI / ☐ NO
I9	E' stata eseguita la verifica dell'integrità e la manutenzione dei vari componenti delle reti?	☐ SI / ☐ NO
